# Control geométrico · revisión V2

189 comprobaciones superadas; 0 fallos.

Planta final: PLANTA DIST. PROY.OBRA.pdf, página 1.

Alturas de vivienda: alzados y secciones del proyecto básico.

Alturas del trastero y puertas: confirmación expresa del usuario.

Escala: 1:1, metros. No se fuerzan las áreas rotuladas.

Comparación vectorial: cuantización máxima local 6,35 mm.

Cotas nominales nuevas: precisión numérica de verificación 0,01 mm.

El informe detalla diferencias entre trazado, cotas y superficies.

Trastero interior: 7,15 × 3,94 m; profundidad exterior 4,19 m.

Piscina: 3,50 × 5,00 m; no se inventa profundidad ni vaso.

Forjado trastero: +3,35 / +3,70 m. Peto: +4,40 m.

Puerta interior: 2,03 m de alto. Portón: 2,50 m de alto.

Se mantienen las alturas diferenciadas del cuerpo existente.

Geometría real medida desde los vértices de Blender.

GLB importado independientemente: dimensiones conservadas.

Mobiliario, vegetación y luminarias son visualización decorativa.

Consultar las discrepancias documentales en control_resultado.json.

SHA256 modelo editable:

3abdabddb1774219b7e444e629cec6b322f12fdb0ef49fe31b96fbffa631d44c

# Calle Macarena · cotejo visual V2

Planta definitiva con trastero · modelo 1:1 · geometría de los meshes reales

Este documento no hereda ningún resultado APTO ni la cuenta de controles de V1. El resultado numérico V2 debe evaluarse por separado antes de los renders fotográficos.

Planta: página1 izquierda del PDF definitivo, registrada +112,68 pt en X, escala nominal fija 1:150 = 0,05291666666666667 m/pt. Una cota escrita prevalece sobre su pequeño residual gráfico; por ello el contorno medido no se deforma para ocultar diferencias del dibujo.

Alzados y secciones: páginas38 y39 del básico. Comparan la geometría existente. La antigua pérgola se sustituye por el trastero del plano final: el volumen nuevo no puede coincidir con las vistas antiguas en ese ámbito.

Trastero: inferior/superior del forjado 3,35/3,70 m, coronación de peto 4,40 m, puerta norte 2,03 m y portón frontal 2,50 m son confirmaciones expresas del usuario V2. Estas alturas no están escritas en el PDF definitivo.

Persisten datos no definidos: profundidad/fondo de piscina, niveles reales de agua y peldaños, mecanismo y despiece del portón, capas/pendientes de cubierta y cielorraso del trastero. Mobiliario, vehículos, vegetación, materiales y luminarias son visualización.

```
Identidad del modelo: SHA256 3abdabddb1774219b7e444e629cec6b322f12fdb0ef49fe31b96fbffa631d44c
```

Mediciones revisión V2; documento generado 2026-10-06 17:59 UTC

# Planta del mesh y superposición con el plano definitivo

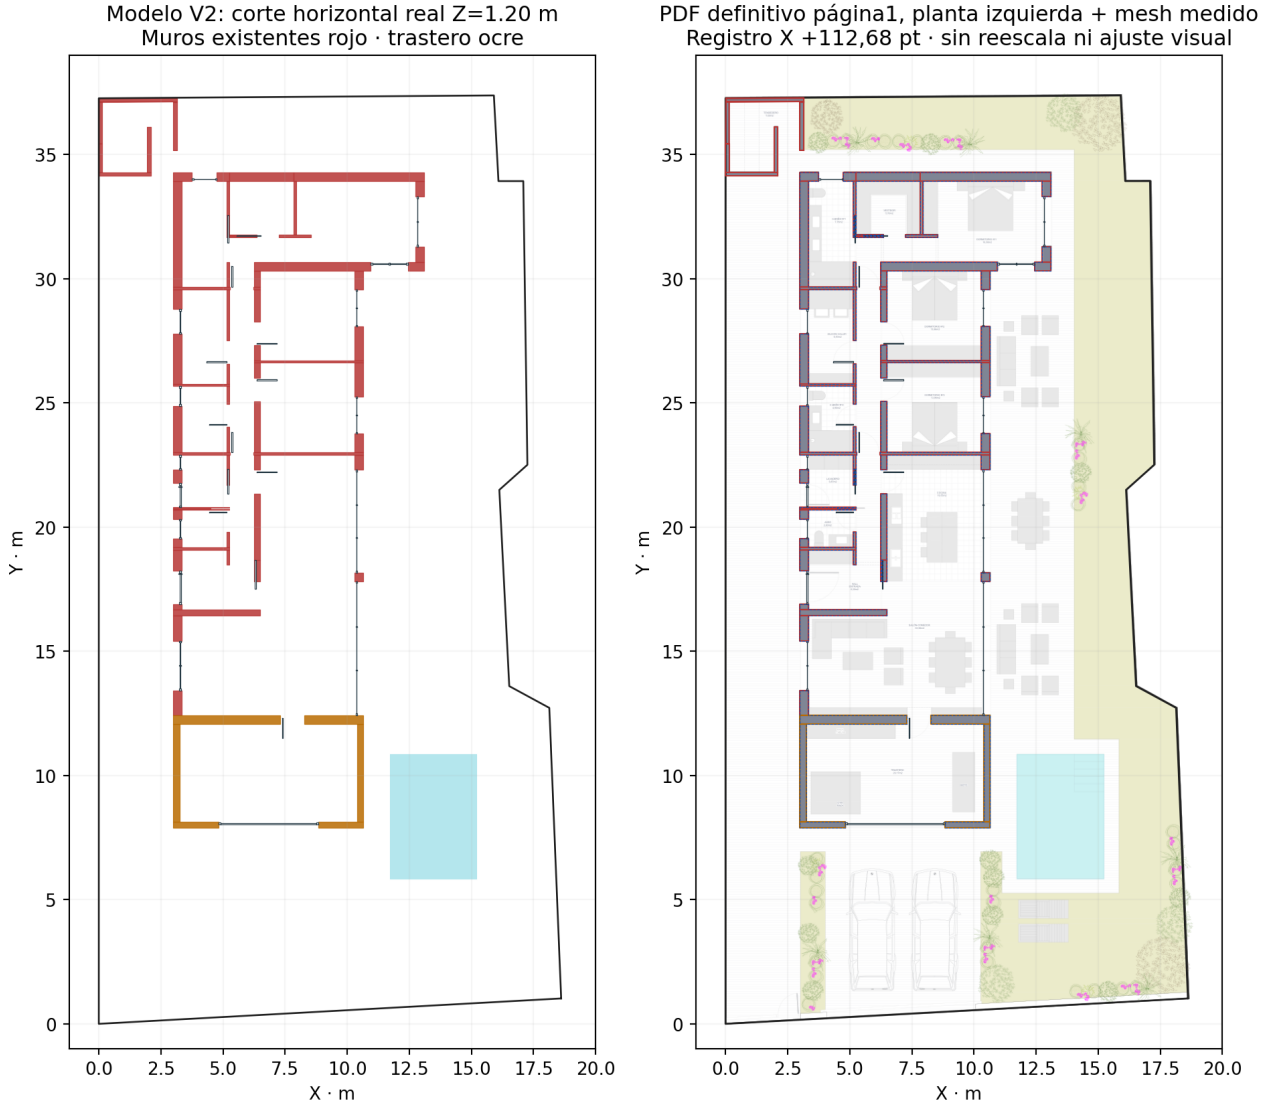


La cota directa prevalece sobre residuos gráficos. Líneas azules: rellenos del PDF; rojo/ocre: mesh.
El cerramiento parcelario aquí se muestra por su lindero documental; las ortográficas 3D están en hojas separadas.

# Alzado · puerta principal

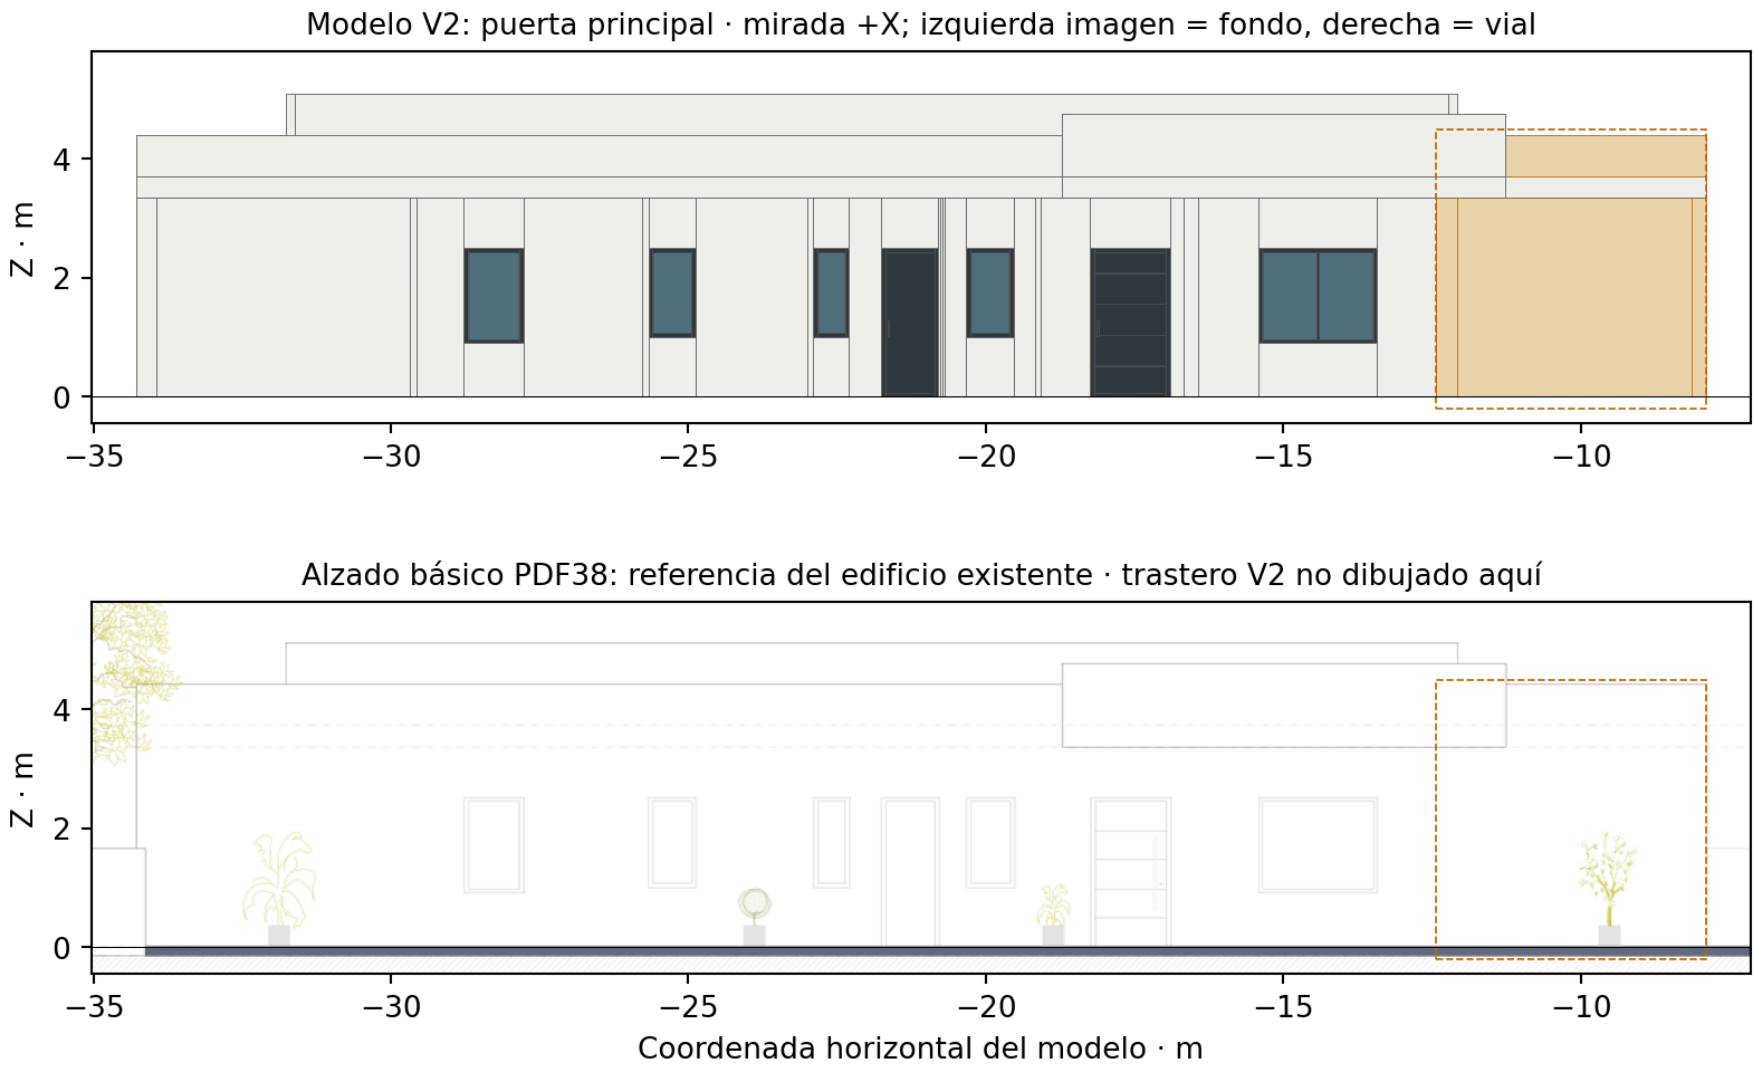


Banda ocre: ámbito del trastero añadido. Sus Z 3,35/3,70/4,40 y huecos 2,03/2,50 proceden del usuario.
El PDF definitivo sólo aporta XY. El cotejo no exige coincidir con la pérgola antigua del alzado básico.

# Alzado · lateral porche

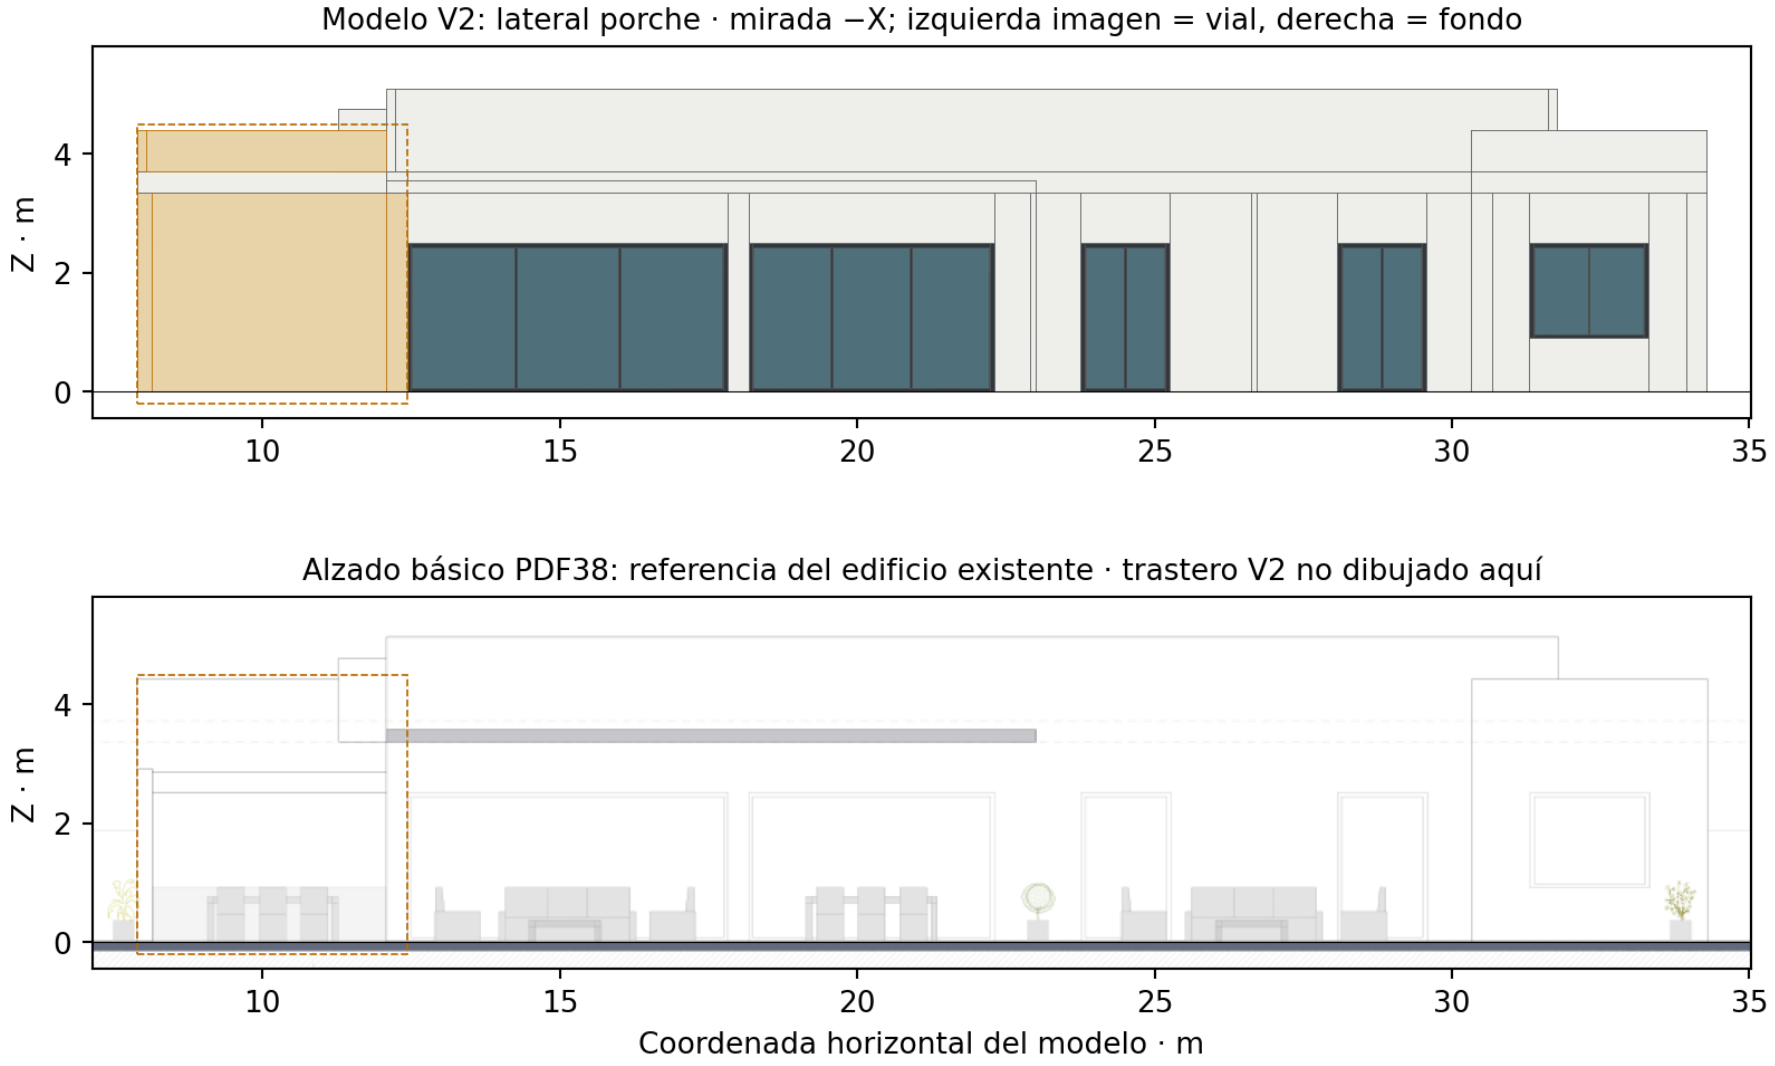


Banda ocre: ámbito del trastero añadido. Sus Z 3,35/3,70/4,40 y huecos 2,03/2,50 proceden del usuario.
El PDF definitivo sólo aporta XY. El cotejo no exige coincidir con la pérgola antigua del alzado básico.

# Alzado · vial publico

Modelo V2: vial publico · mirada +Y; izquierda imagen = calle privada lateral

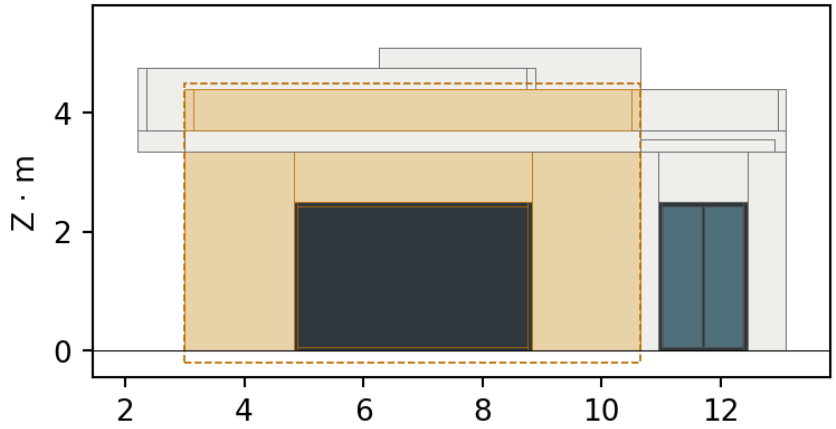


Alzado básico PDF38: referencia del edificio existente · trastero V2 no dibujado aquí

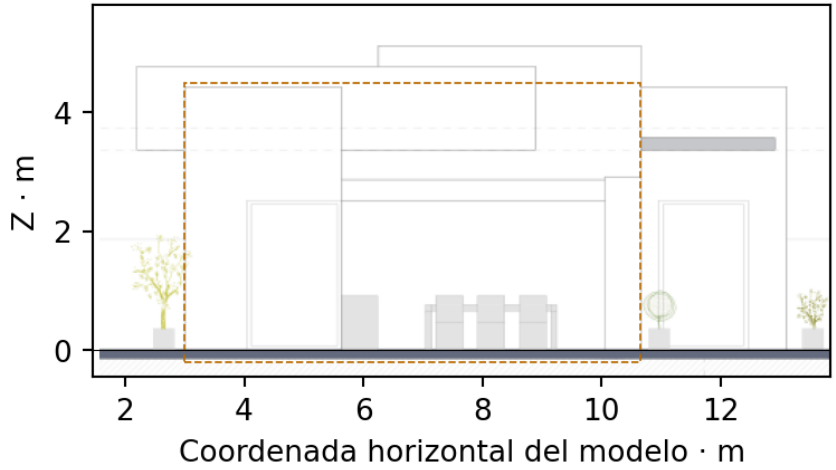


Banda ocre: ámbito del trastero añadido. Sus Z 3,35/3,70/4,40 y huecos 2,03/2,50 proceden del usuario.
El PDF definitivo sólo aporta XY. El cotejo no exige coincidir con la pérgola antigua del alzado básico.

# Alzado · trasero

Modelo V2: trasero · mirada −Y; izquierda imagen = jardín lateral de terraza

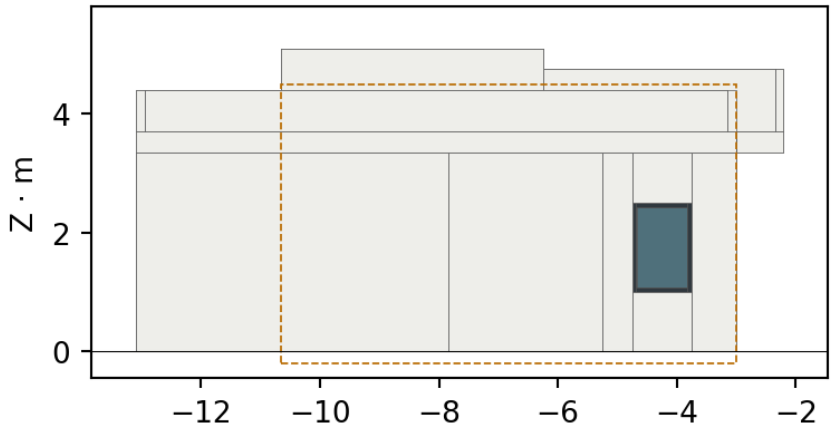


Alzado básico PDF38: referencia del edificio existente · trastero V2 no dibujado aquí

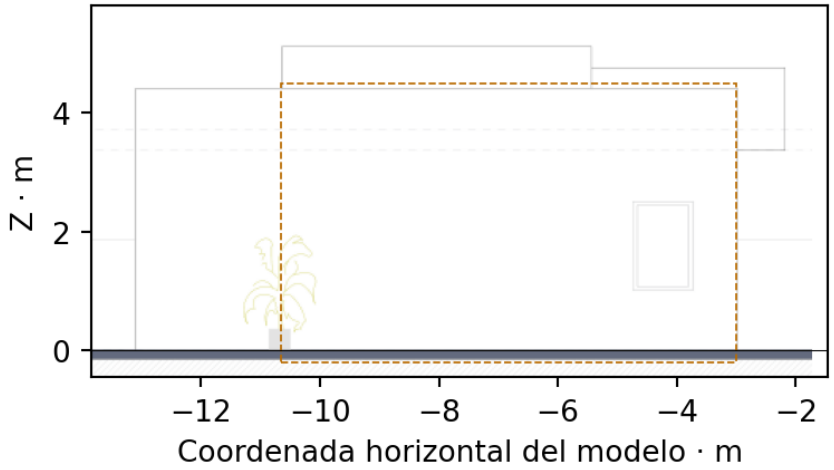


Banda ocre: ámbito del trastero añadido. Sus Z 3,35/3,70/4,40 y huecos 2,03/2,50 proceden del usuario.
El PDF definitivo sólo aporta XY. El cotejo no exige coincidir con la pérgola antigua del alzado básico.

# Niveles del modelo y secciones originales

Cotas extraídas de los meshes V2
× negro modelo · azul básico · ocre usuario V2

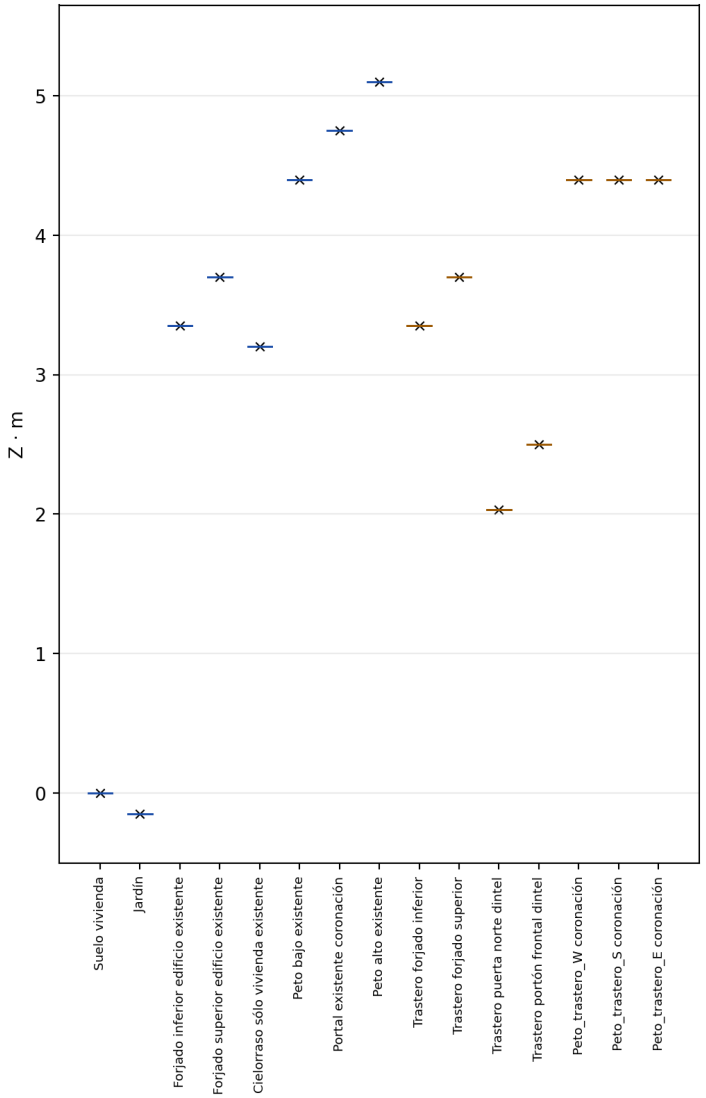


Secciones originales PDF39
Referencia de la geometría existente; no muestran el trastero definitivo

Comparación de niveles, no sección constructiva inventada. No se documenta un cielorraso nuevo del trastero.
La discrepancia de ancho del paño alto entre planta y trasero/sección3 permanece identificada en el control numérico.

# Vista ortográfica V2 · PLANTA_CORTE

Fuente: mismo .blend y mismas mediciones que este informe. Vista analítica de control

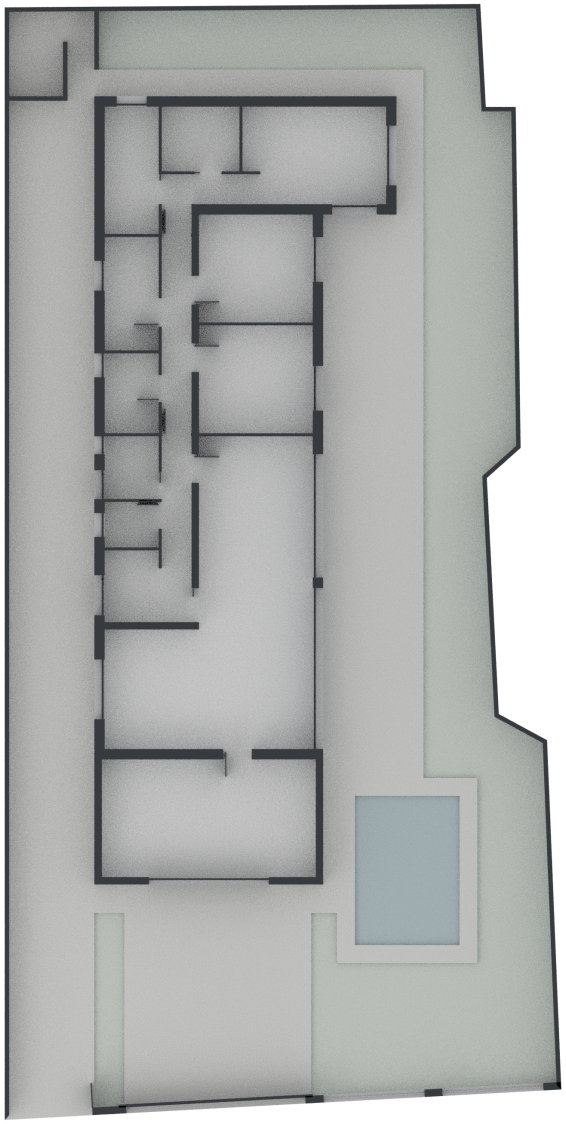

# Vista ortográfica V2 · PLANTA_CUBIERTA

Fuente: mismo .blend y mismas mediciones que este informe. Vista analítica de control

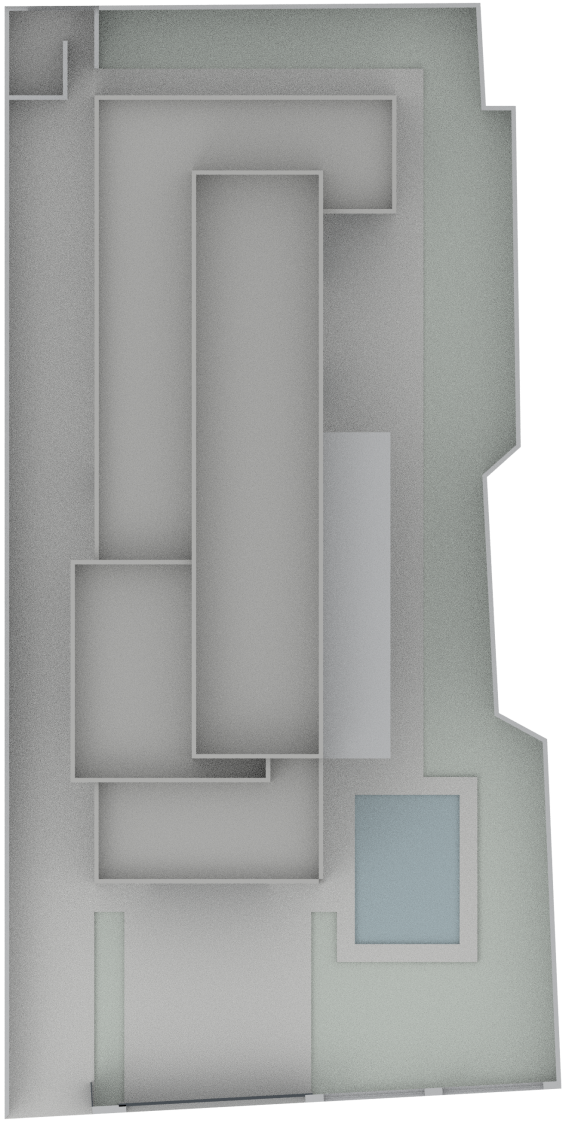

# Vista ortográfica V2 · QA01

Fuente: mismo .blend y mismas mediciones que este informe. Vista analítica de control

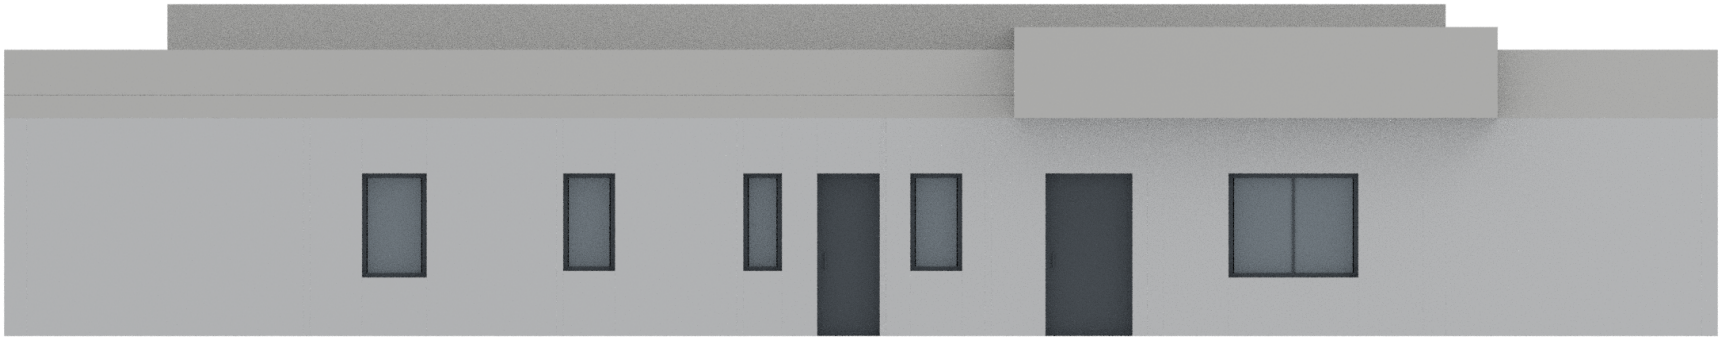

# Vista ortográfica V2 · QA02

Fuente: mismo .blend y mismas mediciones que este informe. Vista analítica de control

# Vista ortográfica V2 · QA03

Fuente: mismo .blend y mismas mediciones que este informe. Vista analítica de control

# Vista ortográfica V2 · QA04

Fuente: mismo .blend y mismas mediciones que este informe. Vista analítica de control

# Geometría principal · valores medidos

| Elemento | Modelo | Referencia | Diferencia | Obtención / fuente |
|---|---|---|---|---|
| Trastero ancho interior m | 7.15000 | 7.15000 | +0.000000 | Cota directa · PDF final1 |
| Trastero fondo interior m | 3.94000 | 3.94000 | -0.000000 | Cota directa · PDF final1 |
| Trastero fondo hasta exterior sur m | 4.19000 | 4.19000 | -0.000000 | Cota directa · PDF final1 |
| Trastero hueco norte ancho m | 0.96000 | 0.96000 | +0.000000 | Cota directa · PDF final1 |
| Trastero portón sur ancho m | 4.00050 | 4.00050 | -0.000000 | Calculada del vector · PDF final1 |
| Trastero superficie interior más umbral m² | 29.17112 | 29.17000 | +0.001123 | Deducción del cómputo; no forzar perímetro · Etiqueta PDF final1 |
| Piscina ancho XY m | 3.50000 | 3.50000 | +0.000000 | Cota directa · PDF final1 |
| Piscina largo XY m | 5.00000 | 5.00000 | -0.000000 | Cota directa · PDF final1 |
| Piscina superficie XY m² | 17.50000 | 17.50000 | -0.000002 | Cotas directas · PDF final1 |
| Parcela área del trazo m² | 635.73859 | 635.60000 | +0.138594 | Vector del lindero; área rotulada no fuerza contorno · Básico memoria / PDF final1 |
| V_bano1_norte ancho de hueco m | 1.00330 | — | — | Mesh medido; comparar con tabla numérica V2 · PDF38 alzados; medidas gráficas calculadas, nominales contrastadas con memoria19/20. |
| V_despacho_oeste ancho de hueco m | 0.99695 | — | — | Mesh medido; comparar con tabla numérica V2 · PDF38 alzados; medidas gráficas calculadas, nominales contrastadas con memoria19/20. |
| V_bano2_oeste ancho de hueco m | 0.80010 | — | — | Mesh medido; comparar con tabla numérica V2 · PDF38 alzados; medidas gráficas calculadas, nominales contrastadas con memoria19/20. |
| V_lavadero_oeste ancho de hueco m | 0.59690 | — | — | Mesh medido; comparar con tabla numérica V2 · PDF38 alzados; medidas gráficas calculadas, nominales contrastadas con memoria19/20. |
| P_lavadero_oeste ancho de hueco m | 0.96520 | — | — | Mesh medido; comparar con tabla numérica V2 · PDF38 alzados; medidas gráficas calculadas, nominales contrastadas con memoria19/20. |
| V_aseo_oeste ancho de hueco m | 0.80010 | — | — | Mesh medido; comparar con tabla numérica V2 · PDF38 alzados; medidas gráficas calculadas, nominales contrastadas con memoria19/20. |

| Elemento | Modelo | Referencia | Diferencia | Obtención / fuente |
|---|---|---|---|---|
| P_principal_oeste ancho de hueco m | 1.33985 | — | — | Mesh medido; comparar con tabla numérica V2 · PDF38 alzados; medidas gráficas calculadas, nominales contrastadas con memoria19/20. |
| V_salon_oeste ancho de hueco m | 2.00025 | — | — | Mesh medido; comparar con tabla numérica V2 · PDF38 alzados; medidas gráficas calculadas, nominales contrastadas con memoria19/20. |
| V_dormitorio1_este ancho de hueco m | 2.00025 | — | — | Mesh medido; comparar con tabla numérica V2 · PDF38 alzados; medidas gráficas calculadas, nominales contrastadas con memoria19/20. |
| V_dormitorio1_sur ancho de hueco m | 1.49860 | — | — | Mesh medido; comparar con tabla numérica V2 · PDF38 alzados; medidas gráficas calculadas, nominales contrastadas con memoria19/20. |
| V_dormitorio2_este ancho de hueco m | 1.49860 | — | — | Mesh medido; comparar con tabla numérica V2 · PDF38 alzados; medidas gráficas calculadas, nominales contrastadas con memoria19/20. |
| V_dormitorio3_este ancho de hueco m | 1.49860 | — | — | Mesh medido; comparar con tabla numérica V2 · PDF38 alzados; medidas gráficas calculadas, nominales contrastadas con memoria19/20. |
| V_cocina_este ancho de hueco m | 4.13385 | — | — | Mesh medido; comparar con tabla numérica V2 · PDF38 alzados; medidas gráficas calculadas, nominales contrastadas con memoria19/20. |
| V_salon_este ancho de hueco m | 5.39115 | — | — | Mesh medido; comparar con tabla numérica V2 · PDF38 alzados; medidas gráficas calculadas, nominales contrastadas con memoria19/20. |

# Niveles · origen de las referencias

| Elemento | Z modelo | Z referencia | Diferencia | Origen |
|---|---|---|---|---|
| Suelo vivienda | 0.00000 | 0.00 | +0.000000 | Básico · Datum PDF38/39 |
| Jardín | -0.15000 | -0.15 | -0.000000 | Básico · PDF38/39 |
| Forjado inferior edificio existente | 3.35000 | 3.35 | -0.000000 | Básico · PDF38/39 |
| Forjado superior edificio existente | 3.70000 | 3.70 | +0.000000 | Básico · PDF38/39 |
| Cielorraso sólo vivienda existente | 3.20000 | 3.20 | +0.000000 | Calculada del básico · Secciones1/3; no se aplica al trastero |
| Peto bajo existente | 4.40000 | 4.40 | +0.000000 | Básico · PDF38/39 |
| Portal existente coronación | 4.75000 | 4.75 | +0.000000 | Básico · PDF38/39 |
| Peto alto existente | 5.10000 | 5.10 | -0.000000 | Básico · PDF38/39 |
| Trastero forjado inferior | 3.35000 | 3.35 | -0.000000 | Usuario V2 · Confirmación expresa del usuario; forjado continuo |
| Trastero forjado superior | 3.70000 | 3.70 | +0.000000 | Usuario V2 · Confirmación expresa del usuario; forjado continuo |
| Trastero puerta norte dintel | 2.03000 | 2.03 | -0.000000 | Usuario V2 · Confirmación expresa del usuario |
| Trastero portón frontal dintel | 2.50000 | 2.50 | +0.000000 | Usuario V2 · Confirmación expresa del usuario |
| Peto_trastero_W coronación | 4.40000 | 4.40 | +0.000000 | Usuario V2 · Confirmación expresa del usuario |
| Peto_trastero_S coronación | 4.40000 | 4.40 | +0.000000 | Usuario V2 · Confirmación expresa del usuario |
| Peto_trastero_E coronación | 4.40000 | 4.40 | +0.000000 | Usuario V2 · Confirmación expresa del usuario |
